

**PASSO 5**  
**CONTRATADA INICIA A**  
**EXECUÇÃO DA OBRA E**  
**GERA RDO PDF**

**R D O**

**app**

**Maio**  
**2021**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



# PASSO A PASSO CONTRATANTE & CONTRATADA



1

**CADASTRO NA LOJA  
RDO App.**



2

**ESCOLHA DO PLANO  
DE ASSINATURA.**



3

**ACESSO AO SISTEMA PARA CRIAR NOVA OBRA  
(ESCOLHA ENTRE CONTRATANTE OU  
CONTRATADA). ENVIAR CONVITE PARA OUTRA  
PARTE (CONTRATADA OU CONTRANTE).**



4

**CONTRATADA INSERE AS ETAPAS E OS  
CARDS DE TAREFAS COM STATUS  
PLANEJADA (CINZA). CONTRATANTE E  
CONTRATADA INSEREM OS SEUS  
COLABORADORES E EQUIPAMENTOS  
NA OBRA.**




5

**CONTRATADA ALTERA STATUS DOS  
CARDS DE TAREFAS PARA “EM  
EXECUÇÃO” (AZUL) QUE RECEBEM  
COMENTÁRIOS, MEDIÇÃO, FOTOS,  
COLABORADORES E MÁQUINAS.  
CONTRATADA GERA E ASSINA O PDF  
DIARIAMENTE.**



6

**ENGENHEIRO CONTRATANTE  
ACESSA SISTEMA PARA  
COMENTAR E ASSINAR RDO PDF  
FECHANDO O CICLO DIÁRIO.**

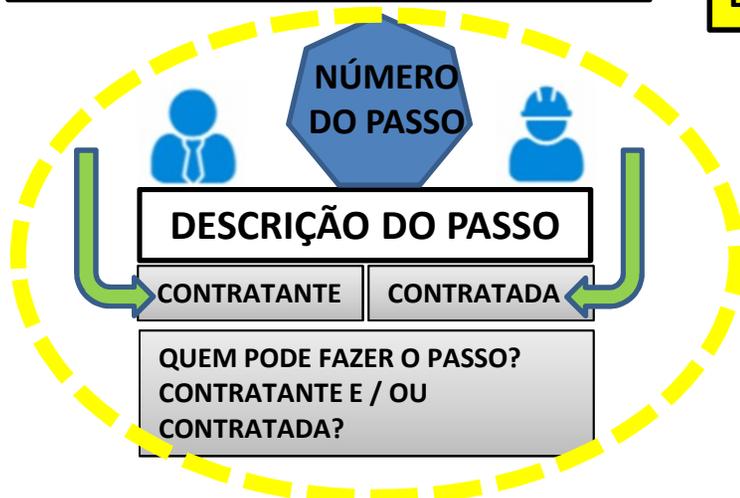

[WWW.RDOAPP.COM.BR](http://WWW.RDOAPP.COM.BR)

[WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR](http://WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR)



@RDOAPP

YouTube

@RDOAPP\_SOFTWARES



**CONTRATADA ALTERA STATUS DOS CARDS DE TAREFAS PARA “EM EXECUÇÃO” (AZUL) QUE RECEBEM COMENTÁRIOS, MEDIÇÃO, FOTOS, COLABORADORES E MÁQUINAS. CONTRATADA GERA E ASSINA O PDF DIARIAMENTE.**

[WWW.RDOAPP.COM.BR](http://WWW.RDOAPP.COM.BR)



[WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR](http://WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR)



@RDOAPP



@RDOAPP SOFTWARES

HOME

FUNCAIONALIDADES

PREÇOS

SUORTE



WHATSAPP  
(11) 2729-2966



CONTA

SISTEMA

SAIR

1

# O VERDADEIRO

CLIQUE NO BOTÃO SISTEMA

# DIÁRIO DE OBRAS

100% DIGITAL



RECEBA NOSSA  
Newsletter



E-mail

ENVIAR



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)

YouTube



000.000.000-00

SENHA

Esqueci a senha

ACESSAR

1

**DIGITE O CPF E A SENHA  
ANTES DE CLICAR NO  
BOTÃO "ACESSAR"**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)

YouTube

1

CLIQUE NO CARD PARA  
ACESSAR A OBRA

Selecione uma das obras abaixo:



CRECHE ESCOLA DA  
VOVÓ

FERROS/MG  
(DIRETOR CONTRATADA (GRATUITA))

0%

BARRA DE PROGRESSO DA OBRA:

● OBRA COM PRAZO ESTIMADO ATINGIDO

● OBRA COM PRAZO ESTIMADO ULTRAPASSADO

● OBRA EM ANDAMENTO



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)

 YouTube

rdo  CRECHE ESCOLA DA VOVÓ       Angelo Andrade

## Etapas / Tarefas

LISTA FILTRO ADICIONAR TAREFA ADICIONAR ETAPA

SELECIONAR TUDO

- + SERVIÇOS PRELIMINARES
- + MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
- + FUNDAÇÕES
- + ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO
- + PISO EM CONCRETO ARMADO
- + PAREDES E REVESTIMENTO
- + COBERTURAS E FECHAMENTOS
- + INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
- + INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

**1**

**CLIQUE NO BOTÃO “+” (MAIS) PARA ABRIR A ÁREA DE CARDS DE TAREFAS**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



**ATENÇÃO:** AO MUDAR UM STATUS DA TAREFA FIQUE ATENTO (A) PARA OS STATUS QUE NÃO RETORNAM MAIS. EXEMPLO: UMA VEZ ESCOLHIDO STATUS FINALIZADA OU CANCELADA NÃO HÁ COMO RETORNAR PARA O STATUS ANTERIOR OU OUTRO STATUS.

 PLANEJADA	<u>PLANEJADA: 1o STATUS AO PLANEJAR UMA TAREFA, UMA VEZ MODIFICADO NÃO É POSSÍVEL VOLTAR.</u>
 EM EXECUÇÃO	<u>PLANEJADA: É O STATUS QUE MAIS SE REPETE NÃO PRECISANDO DEFINIR NOVAMENTE TODA VEZ QUE SE INSERE UMA NOVA MEDIÇÃO.</u>
 FINALIZADA	<u>FINALIZADA: UMA VEZ ESCOLHIDO ESSE STATUS NÃO É POSSÍVEL MODIFICAR.</u>
 PAUSADA	<u>PAUSADA: ESSE STATUS PODE SER MODIFICADO PARA OUTRO STATUS. POR EXEMPLO: PODE PAUSAR PARA UM FIM DE SEMANA OU FERIADO.</u>
 CANCELADA	<u>CANCELADA: UMA VEZ ESCOLHIDO ESTE STATUS NÃO É POSSÍVEL MODIFICAR.</u>

**CASO TENHA ALTERADO UM STATUS POR ENGANO ENTRE EM CONTATO COM NOSSO TIME ATRAVÉS DO EMAIL [contato@rdoapp.com.br](mailto:contato@rdoapp.com.br) QUE VAMOS RESPONDER COM UMA SOLUÇÃO.**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



rdo CRECHE ESCOLA DA VOVÓ Angelo Andrade

**EXISTEM TRÊS MODOS DE MUDAR O STATUS DA TAREFA:  
1) BOTÃO RÁPIDO; 2) BOTÃO LÁPIS E 3) BOTÃO “+”**

Etapas / Tarefas

LISTA

FILTRO ADICIONAR TAREFA ADICIONAR ETAPA

SELECIONAR TUDO

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRA PROJETO

Adicionar nova tarefa

Alterar Status

22/02/2021 À 27/02/2021 22/02/2021 À 05/03/2021

+ MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

+ FUNDAÇÕES

+ ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO

+ PISO EM CONCRETO ARMADO

+ PAREDES E REVESTIMENTO

**1**

**BOTÃO RÁPIDO: BOTÃO COM  
“TRÊS PONTOS VERTICAIS”**

**2**

**BOTÃO “LÁPIS”**

**3**

**BOTÃO “+” (“MAIS”)**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



rdo  CRECHE ESCOLA DA VOVO       Angelo Andrade

Etapas / Tarefas **1) BOTÃO RÁPIDO “TRÊS PONTOS”**   

LISTA  SELECIONAR TUDO  FILTRO  ADICIONAR TAREFA  ADICIONAR ETAPA

**- SERVIÇOS PRELIMINARES**

 PLANEJADA ✓  PROJETOS

 EM EXECUÇÃO  FINALIZADA  PAUSADA  CANCELADA

 Adicionar nova tarefa

 0  0     

22/02/2021 à 05/03/2021

0%

+ MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

+ FUNDAÇÕES

+ ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO

+ PISO EM CONCRETO ARMADO

+ PAREDES E REVESTIMENTO

**1**

**AO CLICAR NO BOTÃO RÁPIDO AS OPÇÕES DE STATUS APARECEM. ESCOLHA UM STATUS E O SISTEMA ADICIONA UMA MEDIÇÃO (ZERADA) PARA O DIA. VAMOS ESCOLHER O STATUS “EM EXECUÇÃO” (AZUL)**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



Etapas / Tarefas

1) BOTÃO RÁPIDO “TRÊS PONTOS”

LISTA SELECIONAR TUDO ALTERAR STATUS EM MASSA FILTRO ADICIONAR TAREFA ADICIONAR ETAPA

SERVIÇOS PRELIMINARES

PROJETOS CANTEIRO DE OBRA Adicionar nova tarefa

22/02/2021 À 05/03/2021	22/02/2021 À 22/02/2021	22/02/2021 À 27/02/2021
8.33%	0%	

+ MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  
+ FUNDAÇÕES  
+ ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO  
+ PISO EM CONCRETO ARMADO

2

MEDIÇÃO ADICIONADA COM A DATA DO DIA. **CUIDADO!** SE QUISER ADICIONAR UMA MEDIÇÃO ANTERIOR A DATA QUE SE ENCONTRA UTILIZE O BOTÃO “+” (MAIS) OU BOTÃO LÁPIS

1

CARD DE TAREFA MUDA DE COR PARA STATUS “EM EXECUÇÃO” (AZUL)

3

BARRA CRONOLÓGICA COMPARA O PERCENTUAL DE DIAS PLANEJADOS VERSUS DIAS EM EXECUÇÃO



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



rdo CRECHE ESCOLA DA VOVÓ Angelo Andrade

## Etapas / Tarefas

### 2) BOTÃO “LÁPIS”

LISTA FILTRO ADICIONAR TAREFA ADICIONAR ETAPA

SELECIONAR TUDO

#### SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRA 22/02/2021 À 27/02/2021 0%  
PROJETOS 22/02/2021 À 05/03/2021 0%

Adicionar nova tarefa

#### MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MECANIZADA 24/02/2021 À 03/03/2021 0%  
BOTA FORA 21/03/2021 À 05/03/2021 0%

Adicionar nova tarefa

+ FUNDAÇÕES

1

**CLIQUE NO BOTÃO “LÁPIS” PARA IR PARA A PÁGINA DAS INFORMAÇÕES SOBRE A TAREFA. ESSE MODO DE MUDANÇA DE STATUS OU INSERÇÃO DE NOVA MEDIÇÃO É UTILIZADO QUANDO O USUÁRIO QUER INSERIR MAIS DETALHES SOBRE A TAREFA COMO HORÁRIO, COLABORADORES, EQUIPAMENTOS OU ACIDENTE**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



**AO CLICAR NO BOTÃO “LÁPIS” NA TAREFA COM STATUS PLANEJADA (CINZA) OS QUATRO BLOCOS DE INFORMAÇÕES APARECEM: 1) PLANEJAMENTO 2) MEDIÇÃO 3) COLABORADORES 4) EQUIPAMENTOS**

**Tarefa / Medição**

Descrição\*  
015 - REDE DE ESGOTO DN 150. Escavação de vala rede de esgoto DN 150

Etapa\*  
EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DN 150

Data Inicial Planejada\*  
07/04/2021

Data Final Planejada\*  
09/04/2021

Unidade de Medida  
METRO CUBICO

Quantidade Planejada  
115

Valor Unitário  
R\$ 0,01

Status\*  
Planejada

Data\*  
24/03/2021

Hora Inicial  
00:00

Hora Final  
00:00

Quantidade Construída  
0

Comentário

**COLABORADORES**

NOME	CARGO	TELEFONE	PERFIL	AÇÕES
Nenhum registro encontrado.				

**EQUIPAMENTOS**

TIPO DE EQUIPAMENTO	descricao	TIPO DE AQUISIÇÃO	FABRICANTE/PROVEDOR	CONTRO	TELEFONE	AÇÕES
Nenhum registro encontrado.						

Buttons: SALVAR TAREFA, ADICIONAR COLABORADOR, NOVO COLABORADOR, SALVAR TAREFA, ADICIONAR EQUIPAMENTOS, NOVO EQUIPAMENTO, VOLTAR, SALVAR TAREFA.

**O BLOCO MEDIÇÃO AINDA NÃO MOSTRA TODAS AS FUNCIONALIDADES POIS O STATUS DA TAREFA ESTÁ COMO PLANEJADA. AO MUDAR O STATUS, OUTRAS OPÇÕES PARA MEDIÇÃO, VÃO APARECER PARA O USUÁRIO**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



Data Final Planejada*	Unidade de Medida	Quantidade Planejada
03/03/2021	METRO CÚBICO	2.000
Valor Unitário		
RS 850		

Status*	Data*	Hora Inicial	Hora Final
Planejada	22/02/2021	00:00	00:00

Selezione...  
Planejada  
Em Execução  
Finalizada  
Pausada  
Cancelada

COLABORADORES

NOME	CARGO	E-MAIL	PERFIL	AÇÕES
Nenhum registro encontrado.				

**1**

**NOTE QUE O STATUS DA TAREFA ESTÁ COMO PLANEJADA. CLIQUE NO MENU PARA MOSTRAR AS OUTRAS OPÇÕES E ESCOLHA UMA.**

**2**

**O SISTEMA TRAZ A DATA DO DIA. CERTIFIQUE QUE ESTÁ USANDO A DATA CERTA PARA A MEDIÇÃO.**

**3**

**NÃO ESQUEÇA DE CLICAR EM "SALVAR TAREFA"!**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



**AO CLICAR NO BOTÃO “LÁPIS” NA TAREFA COM STATUS “EM EXECUÇÃO” (AZUL) OS CINCO BLOCOS DE INFORMAÇÕES APARECEM: 1) PLANEJAMENTO 2) MEDIÇÃO 3) COLABORADORES 4) EQUIPAMENTOS E 5) ACIDENTES**

**MEDIÇÃO**

HISTÓRICO DE MEDIÇÕES + ADICIONAR MEDIÇÃO

Status\* Em Execução Data\* 22/02/2021 Hora Inicial 00:00 Hora Final 00:00

Quantidade Construída 1

Comentário Projetos começam a chegar no canteiro!

Foto Nenhum arquivo selecionado (Tamanho Máx 2mb) ESCOLHER ARQUIVO ADICIONAR FOTO

SALVAR TAREFA ADICIONAR COLABORADOR NOVO COLABORADOR

**NO BLOCO DE MEDIÇÃO A ÚLTIMA MEDIÇÃO APARECE E PODE SER EDITADA. CUIDADO PARA NÃO GRAVAR UMA NOVA MEDIÇÃO POR CIMA DE UMA ANTIGA!**

**CLIQUE NO BOTÃO “HISTÓRICO DE MEDIÇÕES” PARA VER AS MEDIÇÕES DESSA TAREFA**

**CLIQUE NO BOTÃO “+ ADICIONAR MEDIÇÃO” PARA INSERIR UMA NOVA MEDIÇÃO NESSA TAREFA**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



rdo  CRECHE ESCOLA DA VOVÓ       Angelo Andrade

### Etapas / Tarefas

**3) BOTÃO “+” (MAIS)**

LISTA  FILTRO  ADICIONAR TAREFA  ADICIONAR ETAPA

SELECIONAR TUDO

#### SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRA	PROJETOS
 0  0     	    
22/02/2021 À 27/02/2021	22/02/2021 À 05/03/2021
<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%

Adicionar nova tarefa 

- + MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
- + FUNDAÇÕES
- + ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO
- + PISO EM CONCRETO ARMADO
- + PAREDES E REVESTIMENTO

**1**

**CLIQUE NO BOTÃO “+” (MAIS)  
PARA ABRIR A CAIXA DE MEDIÇÃO**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



The screenshot shows the RDO application interface. At the top, there is a header with the RDO logo, a menu icon, the text 'CRECHE ESCOLA DA VOVÓ', and user information 'Angelo Andrade'. The main content area is titled 'Etapas / Tarefas' and contains a list of tasks. A modal window titled 'NOVA MEDIÇÃO' is open, displaying a form with the following fields: 'Status\*' (set to 'Planejada'), 'Data\*' (set to '19/03/2021'), 'Hora Inicial', and 'Hora Final'. Below these are fields for 'Quantidade Construída' and 'Comentário'. At the bottom of the modal are 'SALVAR' and 'CANCELAR' buttons. A yellow arrow points from a yellow shield with the number '1' to the '+' button on a task card in the background.

**AO CLICAR NO BOTÃO “+” DENTRO DO CARD DE TAREFA O BOX DE MEDIÇÃO APARECE E O USUÁRIO PODE INSERIR UMA NOVA MEDIÇÃO. CASO A TAREFA ESTEJA COM STATUS “PLANEJADA” (CINZA) ENTÃO O USUÁRIO DEVE MUDAR O STATUS PARA INSERIR UMA NOVA MEDIÇÃO.**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



NOVA MEDIÇÃO

Status*	Data*	Hora Inicial	Hora Final
Planejada	19/03/2021		

Selezione...

- Planejada
- Em Execução
- Finalizada
- Pausada
- Cancelada

SALVAR CANCELAR

1

**A TAREFA ESTÁ COM STATUS “PLANEJADA” (CINZA) ENTÃO O USUÁRIO DEVE MUDAR O STATUS PARA INSERIR UMA NOVA MEDIÇÃO. CLIQUE NO MENU E ESCOLHA UMA DAS OPÇÕES. VAMOS ESCOLHER “EM EXECUÇÃO”.**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



NOVA MEDIÇÃO

Status*	Data*	Hora Inicial	Hora Final
Em Execução	22/02/2021		

Quantidade Construída  
100

Comentário  
Início da construção do Canteiro da Obra.

Foto  
Construção Canteiro da Obra2.png

ESCOLHER ARQUIVO ADICIONAR FOTO

SALVAR X CANCELAR

**AO ESCOLHER O STATUS "EM EXECUÇÃO" O SISTEMA MOSTRA OS OUTROS CAMPOS PARA SEREM PREENCHIDOS, INCLUINDO OS DOIS BOTÕES PARA ESCOLHER E ADICIONAR UMA FOTO**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)

YouTube

Logo: rdo | Menu: CRECHE ESCOLA DA VOVÓ | User: Angelo Andrade

### Etapas / Tarefas

LISTA  
SELECIONAR TUDO  
ALTERAR STATUS EM MASSA

#### SERVIÇOS PRELIMINARES

PROJETOS

22/02/2021 À 05/03/2021 | 22/02/2021 À 22/02/2021 | 8.33%

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  
FUNDAÇÕES  
ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ  
PISO EM CONCRETO ARMADO

#### NOVA MEDIÇÃO

Status*	Data*	Hora Inicial	Hora Final
Em Execução	22/02/2021		

Quantidade Construída: 100

Comentário: Início da construção do Canteiro da Obra.

Foto: Nenhum arquivo selecionado (Tamanho Máx 2mb)

ESCOLHER ARQUIVO | ADICIONAR FOTO

SALVAR | X CANCELAR

1

**ATENÇÃO:** ALÉM DE CLICAR NO BOTÃO “ESCOLHER FOTO” E, DEPOIS, “ADICIONAR FOTO” O USUÁRIO DEVE CLICAR NO BOTÃO “SALVAR” PARA INSERIR UMA NOVA MEDIÇÃO NA TAREFA



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



**ATENÇÃO: RDO PDF NÃO PODE SER DELETADO MAS O USUÁRIO PODE GERAR QUANTOS RDOs PDF QUISER; DESDE QUE NÃO ASSINE. UMA VEZ ASSINADO POR CONTRATADA (OU CONTRATANTE) NÃO PODE SER MAIS EDITADO.**

**ATENÇÃO: EXISTEM TRÊS STATUS PARA O RDO PDF:**

**GERADO:** ESTE É O PRIMEIRO STATUS QUANDO O RDO PDF É GERADO PELA PRIMEIRA VEZ POR UM PERFIL DE ACESSO CONTRATADA.

**ASSINADO CONTRATADA:** ESTE STATUS É ASSUMIDO QUANDO UM USUÁRIO COM PERFIL DE ACESSO CONTRATADA CLICA NO BOTÃO “CANETA” NA PÁGINA DE RDOs. UMA VEZ COM ESSE STATUS O RDO PDF NÃO PODE MAIS SER GERADO, ALTERADO OU DELETADO.

**ASSINADO CONTRATANTE:** ESTE STATUS É ASSUMIDO APÓS A CONTRATADA ASSINAR E QUANDO UM USUÁRIO DA CONTRATANTE CLICA NO BOTÃO “CANETA” NA PÁGINA DE RDOs. AO CLICAR NO BOTÃO “CANETA” UM BOX PERMITE QUE A CONTRATANTE ESCREVA UM COMENTÁRIO QUE VAI APARECER NO RDO PDF.

**CASO TENHA ASSINADO UM RDO PDF POR ENGANO ENTRE EM CONTATO COM NOSSO TIME ATRAVÉS DO EMAIL [contato@rdoapp.com.br](mailto:contato@rdoapp.com.br) QUE VAMOS RESPONDER COM UMA SOLUÇÃO.**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



Logo: rdo | Menu: CRECHE ESCOLA DA VOVÓ | User: Angelo Andrade

**EXISTEM DOIS MODOS PARA GERAR RDO EM PDF:  
1) BOTÃO RÁPIDO E 2) PÁGINA RDO**

Gerar RDO

FILTRO | ADICIONAR TAREFA | ADICIONAR ETAPA

LISTA

SELECIONAR TUDO

SERVIÇOS PRELIMINARES


CANTEIRO DE OBRA | PROJETOS

Adicionar nova tarefa

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

FUNDAÇÕES

1

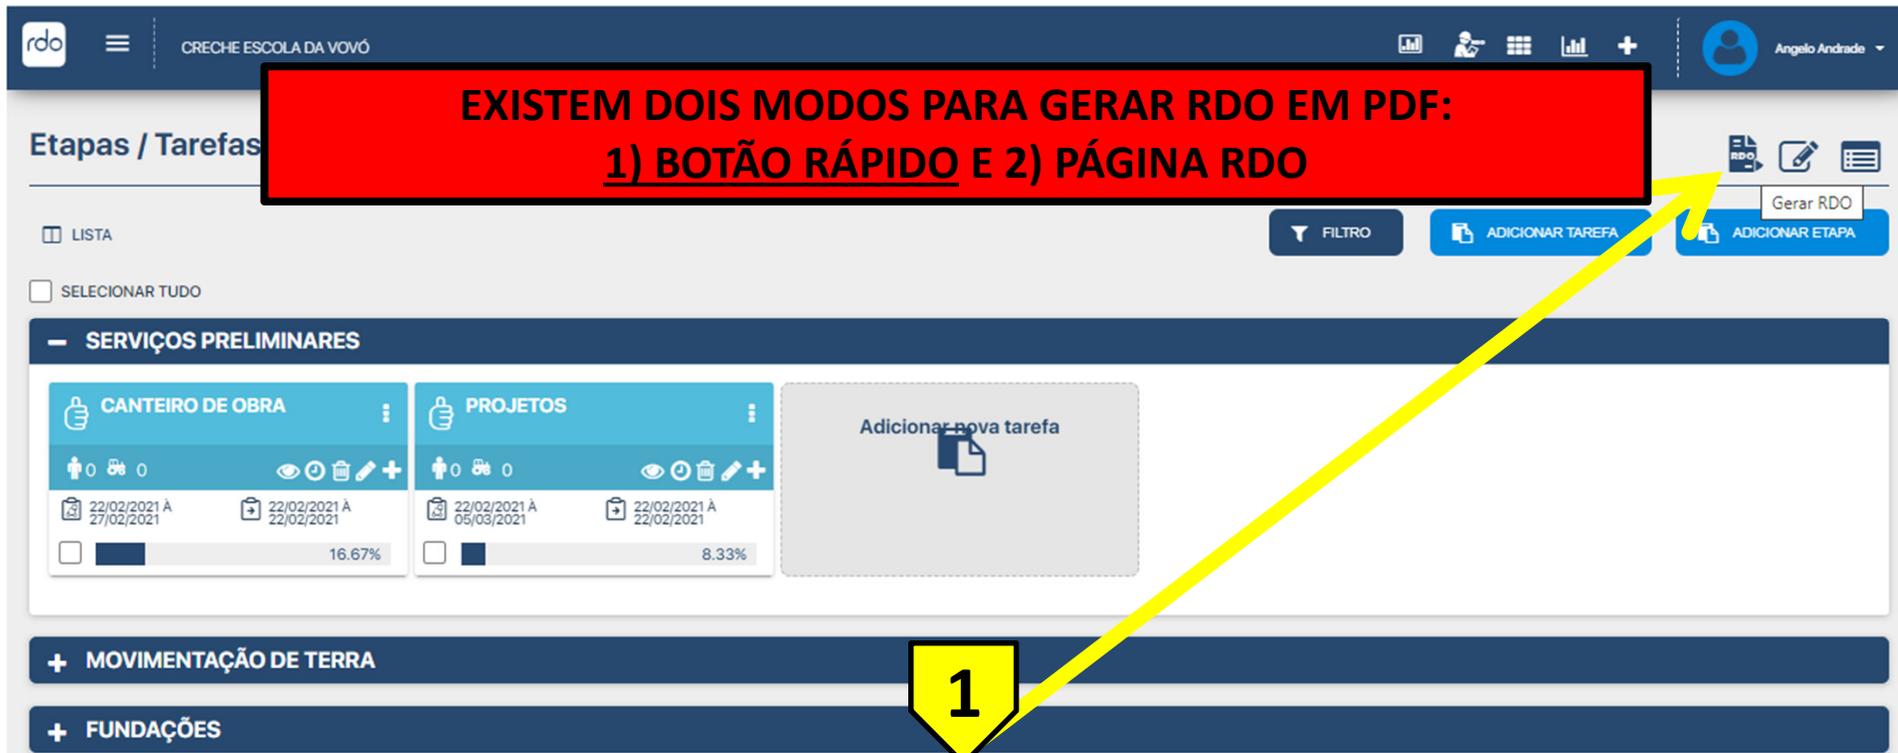

**ESTE É O BOTÃO RÁPIDO “GERAR RDO”. AO CLICAR NELE O SISTEMA GERA O RDO COM AS TAREFAS QUE TÊM MEDIÇÕES PARA O DIA DE HOJE (DATA DO COMPUTADOR) E ASSUME ALGUNS DADOS COMO PADRÃO (DEFAULT), ALGUNS ZERADOS.**

**CASO NÃO EXISTA TAREFAS COM MEDIÇÃO PARA O DIA E EXISTA TAREFAS COM MEDIÇÕES DO DIA ANTERIOR O SISTEMA PERGUNTA SE O USUÁRIO QUER COPIAR AS INFORMAÇÕES DO DIA ANTERIOR PARA O DIA QUE ESTÁ SENDO GERADO. CASO O USUÁRIO ESCOLHA “SIM” O SISTEMA CRIARÁ UMA NOVA MEDIÇÃO PARA CADA TAREFA QUE ESTÁ SENDO GERADO O NOVO RDO PDF COM AS INFORMAÇÕES DA (S) MEDIÇÃO (ÕES) DO DIA ANTERIOR.**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



Logo: rdo

Menu: CRECHE ESCOLA DA VOVÓ

User: Angelo Andrade

### RDO

Data\*  
18/03/2021|

Março, 2021

DO	SE	TE	QU	QU	SE	SA
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3

Tarde:  Bom  Ruim

Noite:  Bom  Ruim

Manhã:  Sem chuva  Pouca chuva  Muita chuva

Tarde:  Sem chuva  Pouca chuva  Muita chuva

Noite:  Sem chuva  Pouca chuva  Muita chuva

Motivos de Improdutividade

Condições Climáticas  Materiais    Equipamentos  Contratante

CONFIRMAÇÃO

Tem certeza que deseja gerar o RDO para a data: 18/03/2021? Caso já tenha sido gerado um RDO para esta data, o mesmo será substituído.

NÃO SIM

1

**AO CLICAR NO BOTÃO RÁPIDO A PRIMEIRA PERGUNTA QUE O SISTEMA FAZ É SE O USUÁRIO TEM CERTEZA QUE QUER GERAR UM NOVO RDO PDF PARA AQUELE DIA (DATA DO COMPUTADOR). CASO JÁ EXISTA UM RDO O SISTEMA GRAVA POR CIMA O NOVO RDO PDF**

**AO CLICAR EM “SIM” O SISTEMA GERA UM RDO PDF SEM FOTOS E ASSUMINDO ALGUNS CAMPOS COMO VAZIOS COMO, POR EXEMPLO, TEMPO E CHUVA**

**CASO NÃO HAJA NENHUMA MEDIÇÃO PARA AQUELE DIA MAS HAJA MEDIÇÕES NO DIA ANTERIOR O SISTEMA PERGUNTA SE O USUÁRIO QUER COPIAR ESSAS INFORMAÇÕES DO DIA ANTERIOR PARA O DIA QUE ESTÁ SENDO GERADO O RDO PDF**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



Logo: rdo | Menu: CRECHE ESCOLA DA VOVÓ | User: Angelo Andrade

**GERANDO RDO EM PDF ATRAVÉS DA PÁGINA RDO**

Etapas / Tarefas

LISTA | SELECIONAR TUDO

FILTRO | ADICIONAR TAREFA | ADICIONAR ETAPA

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

CANTEIRO DE OBRA	PROJETOS
22/02/2021 À 27/02/2021	22/02/2021 À 05/05/2021
16.67%	8.33%

Adicionar nova tarefa

- + MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
- + FUNDAÇÕES
- + ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO
- + PISO EM CONCRETO ARMADO
- + PAREDES E REVESTIMENTO

1

**ESTE É O BOTÃO PARA A PÁGINA DE RDOs. CLIQUE NELE PARA GERAR UM NOVO RDO PDF, VER A LISTA DE RDOs GERADOS, ASSINADOS CONTRATADAS E ASSINADOS CONTRATANTES, ALÉM DE OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE OS RDOs**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



rdo CRECHE ESCOLA DA VOVÓ Angelo Andrade

**ESTA É A PÁGINA ONDE APARECEM OS RDOs MAS AINDA ESTÁ VAZIA POIS, NESTE EXEMPLO, AINDA NÃO GERAMOS NENHUM RDO EM PDF**

RDO

Status Seleccione... Data Inicial dd/mm/aaaa Data Final dd/mm/aaaa

PESQUISAR + NOVO

DATA DO RDO	DIA DA SEMANA	STATUS	QTD TAREFAS	QTD COLABORADORES	QTD EQUIPAMENTOS	AÇÕES
Nenhum registro encontrado.						

**AQUI SERÃO LISTADOS OS RDOs POR DATA, DIA DA SEMANA, STATUS (GERADO, ASSINADO CONTRATADA, ASSINADO CONTRATANTE), QTDE DE TAREFAS, QTDE COLABORADORES, QDO EQUIPAMENTOS E BOTÕES DE AÇÕES (PDF, ASSINAR, EDITAR)**

**1**

**CLIQUE NO BOTÃO “+ NOVO” PARA IR PARA A PÁGINA DE GERAR RDO, O PRIMEIRO RDO EM PDF PARA ESTE EXEMPLO**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



## RDO

Data\*

22/02/2021

< Fevereiro, 2021 >

DO	SE	TE	QU	QU	SE	SA
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	1	2	3	4	5	6

☀️ Tarde:

- Bom  
 Ruim

🌙 Noite:

- Bom  
 Ruim

Chuva:

☀️ Manhã

- Sem chuva  
 Pouca chuva  
 Muita chuva

☀️ Tarde:

- Sem chuva  
 Pouca chuva  
 Muita chuva

🌙 Noite:

- Sem chuva  
 Pouca chuva  
 Muita chuva

## Motivos de Inprodutividade

Condições Climáticas Materiais Paralisações Equipamentos Contratante Fornecedores Mão de obra Projeto Planejamento / Execução Acidente 

1

**AO CLICAR NO BOTÃO "+ NOVO" O SISTEMA MOSTRA A PÁGINA DE GERAR RDO E ASSUME A DATA DO DIA (COMPUTADOR). ESCOLHA UMA DATA PARA PROSSEGUIR**

ETAPAS / TAREFAS

Habilitar relatório fotográfico?  Sim  Não

+ SERVIÇOS PRELIMINARES

[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)

← VOLTAR

📄 GERAR RDO

RDO

APÓS ESCOLHER A DATA É POSSÍVEL ESCOLHER AS OPÇÕES DE TEMPO E CHUVA. CASO NÃO SEJAM ESCOLHIDOS O RDO PDF ASSUME COMO “NÃO INFORMADO”

Data\*  
22/02/2021

Clima

Tempo:

☀ Manhã

 Bom  
 Ruim

☀ Tarde:

 Bom  
 Ruim

🌙 Noite:

 Bom  
 Ruim

Chuva:

☀ Manhã

 Sem chuva  
 Pouca chuva  
 Muita chuva

☀ Tarde:

 Sem chuva  
 Pouca chuva  
 Muita chuva

🌙 Noite:

 Sem chuva  
 Pouca chuva  
 Muita chuva

Motivos de Improdutividade

Condições Climáticas Materiais Paralisações Equipamentos Contratante Fornecedores Mão de obra Projeto Planejamento / Execução Acidente 

Comentários

ESCREVA AQUI OS COMENTÁRIOS DA CONTRATADA

OS MOTIVOS DE IMPRODUTIVIDADE NÃO SAEM NO RDO PDF. ELES SÃO A BASE PARA O DASHBOARD DOS RDOs

ETAPAS / TAREFAS

+ SERVIÇOS PRELIMINARES

ESCOLHA “POSITIVO” OU “NEGATIVO” PARA O TIPO DE COMENTÁRIO OU DEIXE SEM MARCAR. ESSAS INFORMAÇÕES VÃO PARA O DASHBOARD DOS RDOs

CLIQUE NO SINAL DE “+” PARA ABRIR E ESCOLHER AS TAREFAS QUE VÃO SAIR NO RDO PDF

HABILITE O RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESCOLHENDO A OPÇÃO “SIM”

NÃO ESQUEÇA DE CLICAR NO BOTÃO “GERAR RDO”

Habilitar relatório fotográfico?  Sim  Não

← VOLTAR

GERAR RDO

Data\*  
18/02/2021

## MODELO DE PÁGINA "GERAR RDO" PREENCHIDA

Clima

Tempo:

☀ Manhã  
 Bom  
 Ruim

☀ Tarde:  
 Bom  
 Ruim

🌙 Noite:  
 Bom  
 Ruim

Chuva:

☀ Manhã  
 Sem chuva  
 Pouca chuva  
 Muita chuva

☀ Tarde:  
 Sem chuva  
 Pouca chuva  
 Muita chuva

🌙 Noite:  
 Sem chuva  
 Pouca chuva  
 Muita chuva

Motivos de Improdutividade

Condições Climáticas

Materiais

Paralisações

Equipamentos

Contratante

Fornecedores

Mão de obra

Projeto

Planejamento / Execução

Acidente

**NÃO ESCOLHEMOS NENHUM MOTIVO DE IMPRODUTIVIDADE**

Comentários

TUDO TRANQUILO NO PRIMEIRO DIA DE OBRA!

**NÃO MARCAMOS NEM "POSITIVO" OU "NEGATIVO"**

**HABILITAMOS O RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Habilitar relatório fotográfico?  Sim  Não

ETAPAS / TAREFAS

— SERVIÇOS PRELIMINARES

<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRIÇÃO DA TAREFA	STATUS	QTD. COLABORADORES	QTD. EQUIPAMENTOS	AÇÕES
<input checked="" type="checkbox"/>	CANTEIRO DE OBRA	Em Execução	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	PROJETOS	Em Execução	0	0	

**NO DIA 18/2 TEM DUAS TAREFAS COM STATUS EM EXECUÇÃO; MARCAMOS AS DUAS**

FOTOS DA(S) TAREFA(S)

— CANTEIRO DE OBRA

SELECIONAR TUDO



**UMA TAREFA (CANTEIRO DE OBRA) TEM UMA FOTO. PRECISAMOS MARCAR A FOTO PARA ELA SAIR NO RDO PDF**

**NÃO ESQUEÇA DE CLICAR NO BOTÃO "GERAR RDO"**

GERAR RDO

The screenshot shows the RDO app interface for 'CRECHE ESCOLA DA VOVÓ'. A confirmation dialog box is displayed in the center, asking: 'CONFIRMAÇÃO' and 'Tem certeza que deseja gerar o RDO para a data: 18/02/2021? Caso já tenha sido gerado um RDO para esta data, o mesmo será substituído.' The dialog has two buttons: 'NÃO' and 'SIM'. A yellow arrow points from the 'SIM' button in the dialog to the 'GERAR RDO' button at the bottom right of the screen. The background shows a table with columns for 'DESCRIÇÃO DA TAREFA', 'STATUS', 'QTD. COLABORADORES', 'QTD. EQUIPAMENTOS', and 'AÇÕES'. Below the table, there is a section for 'FOTOS DA(S) TAREFA(S)' with a sub-section for 'CANTEIRO DE OBRA' containing a photo of a construction site.

**ESTA É A CAIXA DE CONFIRMAÇÃO QUE VAI APARECER APÓS O USUÁRIO PREENCHER AS INFORMAÇÕES ANTES DE CLICAR NO BOTÃO “GERAR RDO”. CLIQUE EM “SIM” PARA GERAR O PRIMEIRO RDO PDF DESTE EXEMPLO**

**APÓS ESCOLHER DATA, ESCOLHER AS OPÇÕES DE TEMPO E CHUVA, ESCOLHER (OU NÃO) SE HOUVE MOTIVO (S) DE IMPRODUTIVIDADE, ESCREVER OS COMENTÁRIOS, ESCOLHER (OU NÃO) SE “POSITIVO” OU “NEGATIVO”, HABILITAR RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ESCOLHER AS FOTOS CLIQUE NO BOTÃO “GERAR RDO”.**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



rdo CRECHE ESCOLA DA VOVÓ

Angelo Andrade

### RDO

Status Selecion... Data Inicial dd/mm/aaaa Data Final dd/mm/aaaa

PESQUISAR NOVO

DATA DO RDO	DIA DA SEMANA	STATUS	QTD TAREFAS	QTD COLABORADORES	QTD EQUIPAMENTOS	AÇÕES
22/02/2021	segunda-feira	Gerado	2	0	0	  

**BOTÃO PARA ABRIR O PDF**

**STATUS DO RDO PDF: GERADO**

**BOTÃO PARA ASSINAR O RDO**

**BOTÃO PARA EDITAR O RDO**

RDO App © 2019. Todos os direitos reservados

**APÓS GERAR O RDO PDF O SISTEMA MOSTRA A PÁGINA DE RDOs COM O ÚNICO RDO PDF GERADO ATÉ AGORA. NA MAIORIA DOS SISTEMAS O RDO PDF VAI ABRIR AUTOMATICAMENTE MAS CERTIFIQUE QUE O SEU SISTEMA TAMBÉM ABRIU O PDF. CASO O PDF NÃO FOI ABERTO AUTOMATICAMENTE PROCURE PELO ARQUIVO PDF EM "DOWNLOADS" DO SEU COMPUTADOR / CELULAR**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CRECHE ESCOLA DA VOVÓ

R. Fernando Dias de Carvalho, 16, Centro, FERROS - MG, CEP: 35800-000.

Início da Obra: 22/02/2021  
Previsão Final Obra: 23/08/2021  
Data do RDO: 22/02/2021 segunda-feira  
Dias Decorridos: 1  
Dias Restantes: 121  
Status RDO: Gerado

ETAPAS / TAREFAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição	Status	Comentário
CANTEIRO DE OBRA	Em Execução	Início da construção do Canteiro da Obra.
PROJETOS	Em Execução	Projetos começam a chegar no canteiro!

COLABORADORES

Cargo	Gtd.
Total	

EQUIPAMENTOS

Tipo	Gtd.
Total	

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Período	Tempo	Chuva
Manhã	Bom	Sem Chuva
Tarde	Bom	Sem Chuva
Noite	Bom	Sem Chuva

ACIDENTES

Descrição	Houve Afastamento?
Não houveram acidentes.	

COMENTÁRIO CONTRATADA:

TUDO TRANQUILO NO PRIMEIRO DIA DE OBRA!

STATUS DO RDO PDF: GERADO

Consulte nossas opções de planos e preços para assinaturas com certificado digital! Escreva um e-mail para contato@rdoapp.com.br para saber mais!

PRIMEIRA PÁGINA DO RDO PDF



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Data do RDO: 22/02/2021 segunda-feira

SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA



SEGUNDA PÁGINA DO RDO PDF



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



rdo CRECHE ESCOLA DA VOVÓ

Angelo Andrade

### RDO

Status  
Selecione...

CONFIRMAÇÃO

Tem certeza que deseja assinar o RDO de data: 22/02/2021?

NÃO SIM

PESQUISAR NOVO

DATA DO RDO	DIA DA SEMANA	STATUS	QTD TAREFAS	QTD COLABORADORES	QTD EQUIPAMENTOS	AÇÕES
22/02/2021	segunda-feira	Gerado	2	0	0	  

RDO App © 2019. Todos os direitos reservados

**CLICAMOS NO BOTÃO “ASSINAR RDO” E O SISTEMA MOSTRA UMA CAIXA DE CONFIRMAÇÃO (“TEM CERTEZA QUE DESEJA ASSINAR O RDO DO DIA 22/02/2021?”). VAMOS CLICAR EM “SIM” ...**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



The screenshot shows the RDO App interface for 'CRECHE ESCOLA DA VOVÓ'. At the top right, a green notification banner displays 'Registro assinado.' with a checkmark icon. Below this is a search and filter section with fields for 'Status', 'Data Inicial', and 'Data Final', along with 'PESQUISAR' and 'NOVO' buttons. A table lists RDO records with columns: DATA DO RDO, DIA DA SEMANA, STATUS, QTD TAREFAS, QTD COLABORADORES, QTD EQUIPAMENTOS, and AÇÕES. The first row shows a record for 22/02/2021, segunda-feira, with status 'Assinado Contratada', 2 tasks, 0 collaborators, and 0 equipments. The 'AÇÕES' column for this row contains a document icon, a disabled signature icon, and a refresh icon. A yellow arrow points from the 'Assinado Contratada' status to a yellow box below. Another yellow arrow points from the disabled signature icon to another yellow box. A third yellow arrow points from the 'Registro assinado.' message to a large yellow box at the bottom.

DATA DO RDO	DIA DA SEMANA	STATUS	QTD TAREFAS	QTD COLABORADORES	QTD EQUIPAMENTOS	AÇÕES
22/02/2021	segunda-feira	Assinado Contratada	2	0	0	[Document Icon] [Disabled Signature Icon] [Refresh Icon]

**STATUS DO RDO PDF:  
ASSINADO CONTRATADA**

**BOTÃO PARA ASSINAR O RDO  
DESABILITADO**

**AO CLICAR EM “SIM” NA CAIXA DE CONFIRMAÇÃO O SISTEMA MOSTRA UMA MENSAGEM “REGISTRO ASSINADO” (CANTO SUPERIOR DIREITO DA TELA), ABRE O RDO PDF, O BOTÃO “ASSINAR RDO” FICA DESABILITADO E O STATUS DO RDO PDF MUDA PARA “ASSINADO CONTRATADA”**



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CRECHE ESCOLA DA VOVÓ

R. Fernando Dias de Carvalho, 16, Centro, FERROS - MG, CEP: 35800-000.

Início da Obra:	22/02/2021	Dias Decorridos:	1
Previsão Final Obra:	23/06/2021	Dias Restantes:	121
Data do RDO:	22/02/2021 segunda-feira	Status RDO:	Assinado Contratada



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Data do RDO: 22/02/2021 segunda-feira

SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA



ETAPAS / TAREFAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição	Status	Comentário
CANTEIRO DE OBRA	Em Execução	Início da construção do Canteiro da Obra.
PROJETOS	Em Execução	Projetos começam a chegar no canteiro!

COLABORADORES

Cargo	Qtd.
Total	

EQUIPAMENTOS

Tipo	Qtd.
Total	

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Período	Tempo	Chuva
Manhã	Bom	Sem Chuva
Tarde	Bom	Sem Chuva
Noite	Bom	Sem Chuva

ACIDENTES

Descrição	Houve Acidentes?
Não houveram acidentes.	

COMENTÁRIO CONTRATADA:

TUDO TRANQUILO NO PRIMEIRO DIA DE OBRA!

**STATUS DO RDO PDF: ASSINADO CONTRATADA**

ASSINATURA CONTRATADA

Responsável Assinatura:	Angelo Andrade
Cargo:	ENGENHEIRO CIVIL
Data/Hora:	29/03/2021 19:16:33
IP:	177.25.166.116

Consulte nossas opções de planos e preços para assinaturas com certificado digital! Escreva um e-mail para contato@rdoapp.com.br para saber mais!

**ASSINATURA CONTRATADA**

**SEGUNDA PÁGINA DO RDO PDF**

**PRIMEIRA PÁGINA DO RDO PDF**

# PRÓXIMO PASSO



**ENGENHEIRO CONTRATANTE ACESSA SISTEMA PARA  
COMENTAR E ASSINAR RDO PDF FECHANDO O CICLO DIÁRIO.**



[WWW.RDOAPP.COM.BR](http://WWW.RDOAPP.COM.BR)

[WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR](http://WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR)



[@RDOAPP](https://www.instagram.com/RDOAPP)

 **YouTube**

[@RDOAPP\\_SOFTWARES](https://www.youtube.com/@RDOAPP_SOFTWARES)



**@RDOAPP**



**@RDOAPP SOFTWARES**

**WWW.RDOAPP.COM.BR**

**WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR**
